26. 08. 2026
Příloha k č.j. 153201/00126
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY
- dos -
1/3

DIO „I/20 oprava objízdné trasy mostu ev.č. 20-005 KFELY"

Jedná se o opravu povrchu komunikace p.p.č. 1008/2, 836/3, 1043 k.ú. Kfely u Horního Slavkova a p.p.č. 1720/7 a 1720/1 k.ú. Stanovice v délce cca 686 m. Realizace bude probíhat za částečné uzavírky, pouze v době pokládky (cca 3 dny) za úplné uzavírky.

Postup realizace stavby bude projednán s dotčenými subjekty, které komunikaci využívají. Jedná se o: Loketské městské lesy s.r.o., Lesní společnost Bečov, Lesy ČR a majitelé přilehlých nemovitostí.

V době částečné uzavírky se nejprve udělá celý pravý jízdní pruh a následně pak celý levý jízdní pruh. Na komunikaci bude na každé hraně po odfrézování asfaltových vrstev umístěno **DZ A7a.**

V případě úplné uzavírky, bude komunikace uzavřena na nejnutnější dobu. Komunikace bude uzavřena v prac. dobu 7:30 – 17:00 hod. Mimo pracovní dobu bude komunikace průjezdná, případně po dohodě se stavbyvedoucím i v pracovní dobu. Dotčené subjekty budou v dostatečném předstihu informovány o přesném termínu pokládky.

Provoz bude řízen dostatečným počtem náležitě poučených zaměstnanců zhotovitele, kteří budou vybaveni reflexní vestou, zastavovacím terčem a vysílačkou.

Termín realizace: 08-09/2026, dle vyřízení potřebných žádostí. Kontaktní osoba ve věcech stavby: Jan Benka tel.: 725 052 003.

DIO : I/20 Oprava objízdné trasy mostu
ev. č. 20-005 Kfely
– celková situace

26. 08. 2026
Příloha k č.j. 15320/OD/26
MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY 2/5

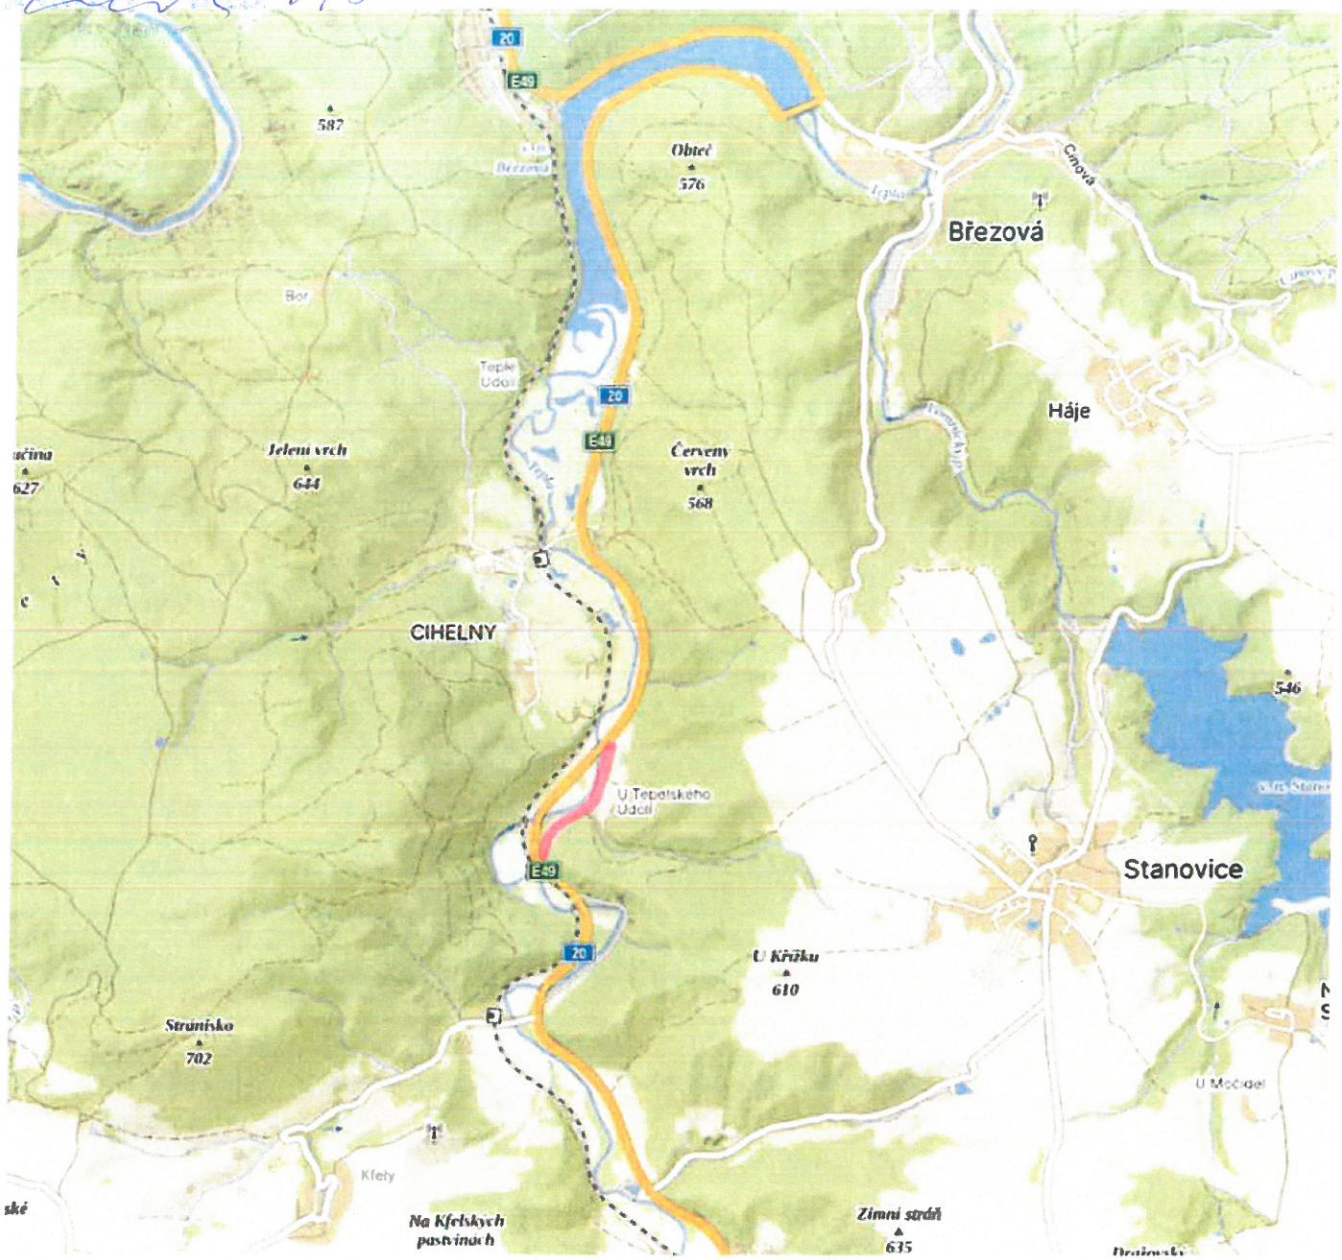

pracovní úsek

D10 : I/20 oprava obl'adné trasy mostu ev.č. 20-005 Ktely

úplná uzavírka
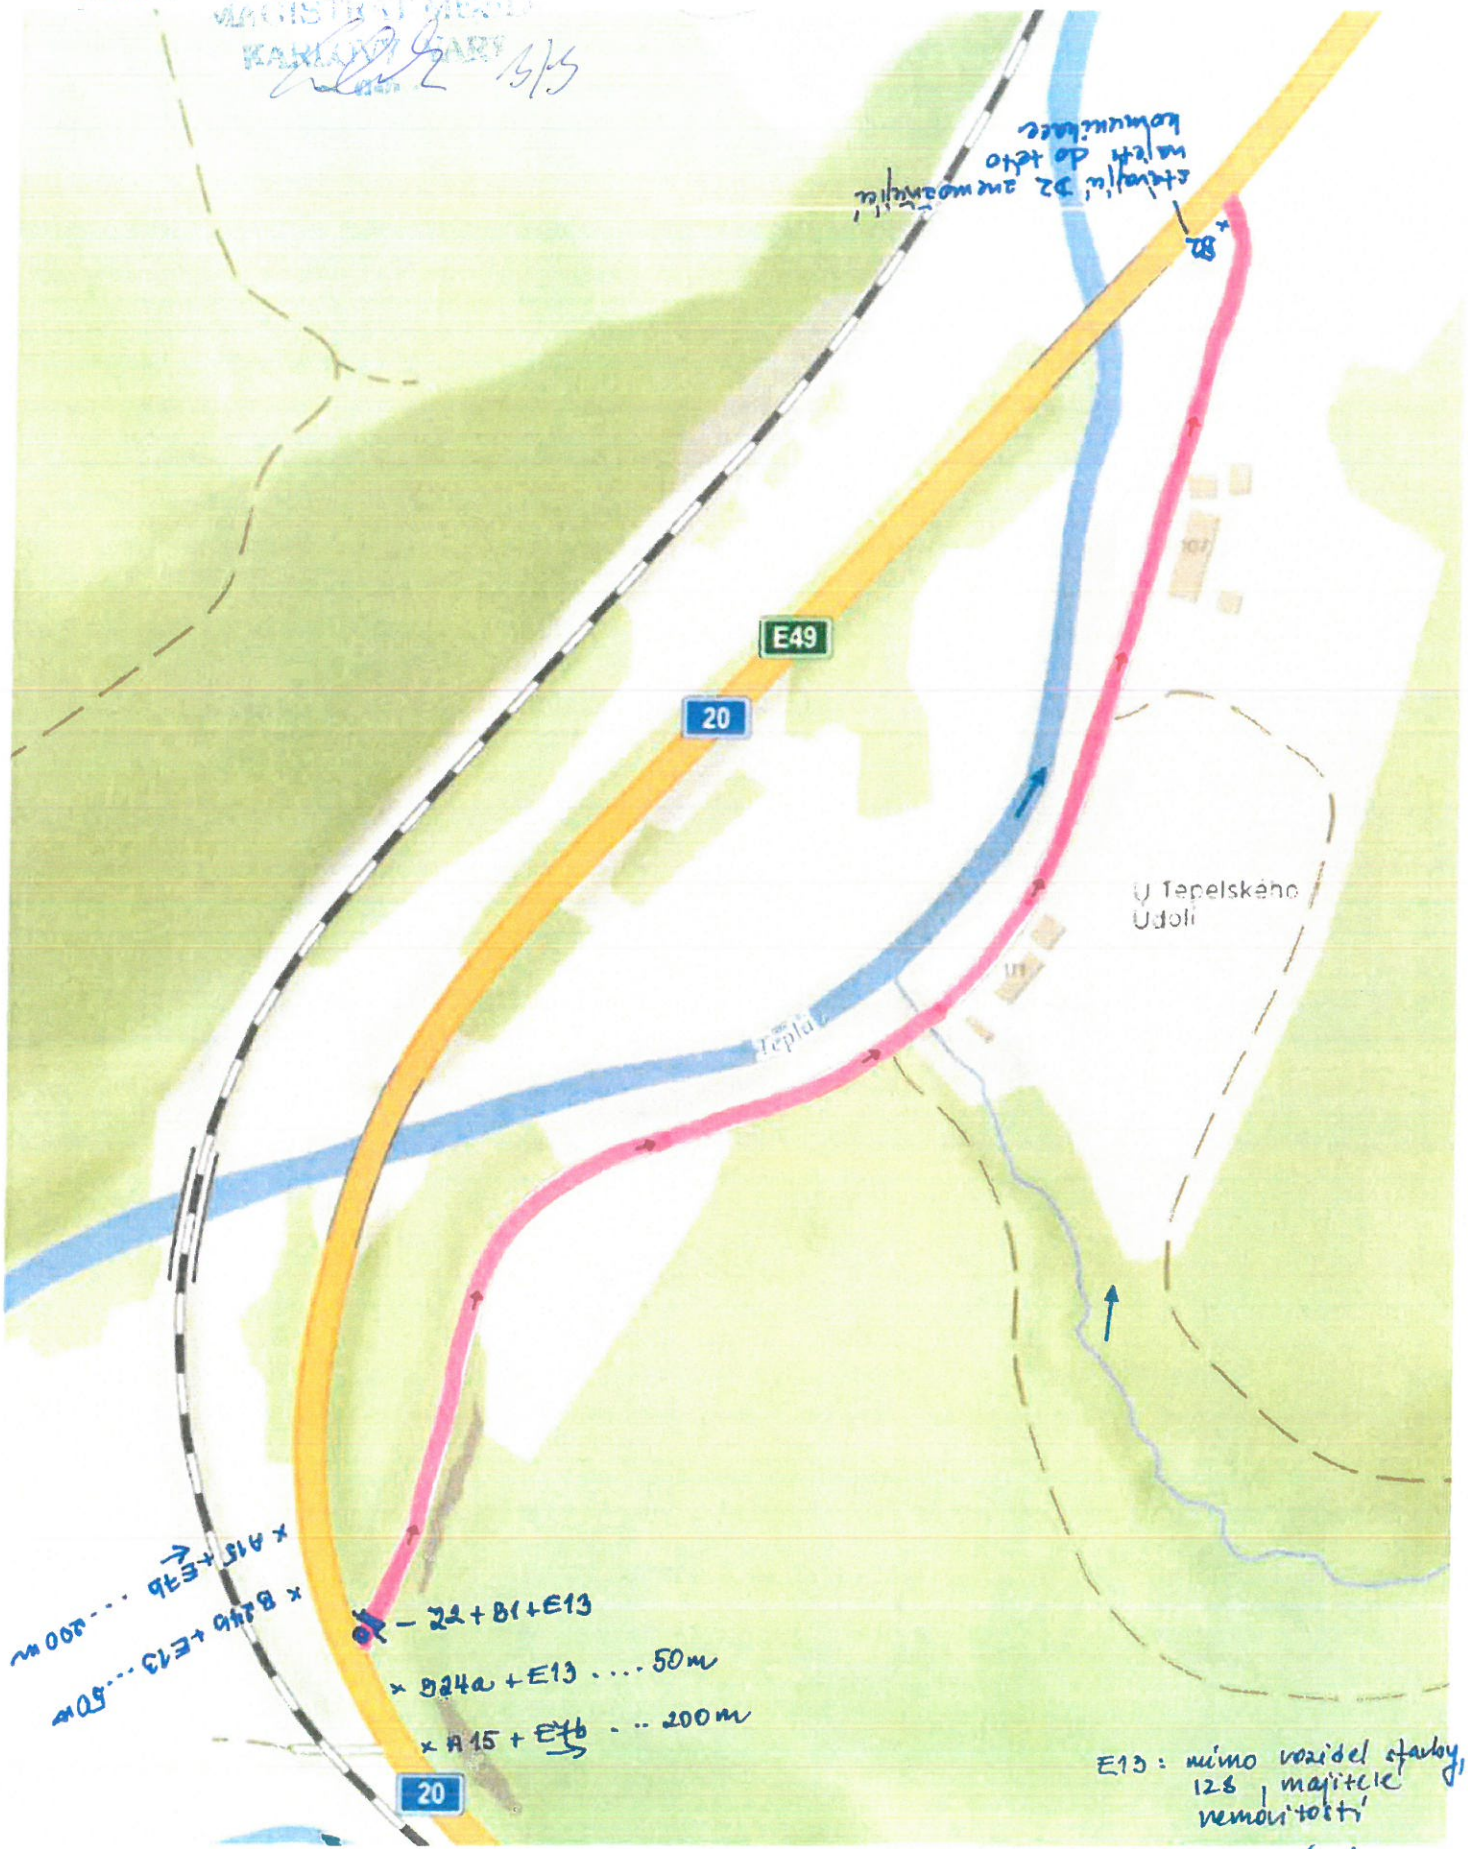
26. 08. 2026
